興隆圳渡槽等強化工程-展延工期預定進度表

項目	任務名稱	工期	開始日期	完成日期	前置任務	百比	年/月	112年11月20日~113年7月20日	113年7月	113年8月	113年9月1日~114年2月2日	114年2月	114年3月	114年4月	114年5月	114年6月	114年7月	114年8月	114年9月	114年10月	114年11月
							工期	0	11	31	155	26	31	30	31	30	31	31	30	31	17
1	興隆圳渡槽等強化工程	722 d	11月20日星期...	11月17日星期...		100%															
2	工程開工	1 d	11月20日星期...	11月20日星期...																	
3	工程停工	244 d	11月20日星期...	7月20日星期六		90%															
4	材料送審	30 d	7月21日星期日	8月19日星期一	3																
5	測量放樣	12 d	8月20日星期二	8月31日星期六	4																
6	汛期影響及變更未完成停工	155 d	9月1日星期日	2月2日星期日		80%															
7	水保設施	23 d	2月3日星期一	2月25日星期二	6																
8	施工便道	32 d	2月26日星期三	3月29日星期六	7	70%															
9	新設管線段工程	190 d	3月30日星期日	10月6日星期一	8																
10	擋土設施(鋼軌樁)	20 d	3月30日星期日	4月18日星期五	8	60%															
11	井式基礎工程	90 d	4月19日星期六	7月17日星期四	10																
12	固定座施作	30 d	7月18日星期五	8月16日星期六	11																
13	鋼構管線	55 d	8月17日星期日	10月11日星期...	12	50%															
14	φ500mm送水管	50 d	8月17日星期日	10月6日星期一	12																
15	維修步道欄杆	20 d	10月7日星期二	10月29日星期...	14																
16	新設明渠段工程	40 d	7月18日星期五	8月26日星期二	11	40%															
17	0+000~0+029(鋼筋、模板組立)	15 d	7月18日星期五	8月1日星期五	11																
18	#1靜水井	10 d	8月2日星期六	8月11日星期一	17	30%															
19	S2水門(50cm*60cm)	5 d	8月12日星期二	8月16日星期六	18																
20	#2靜水井	10 d	8月17日星期日	8月26日星期二	19	20%															
21	其他工程	25 d	8月27日星期三	9月20日星期六	20																
22	噴漿掛網	25 d	8月27日星期三	9月20日星期六	20	10%															
23	工區整理復舊	15 d	10月30日星期...	11月15日星期...	15																
24	假設工程	270 d	2月3日星期一	11月4日星期二	6																
25	工程報竣	1 d	11月17日星期...	11月17日星期...	23	0%															

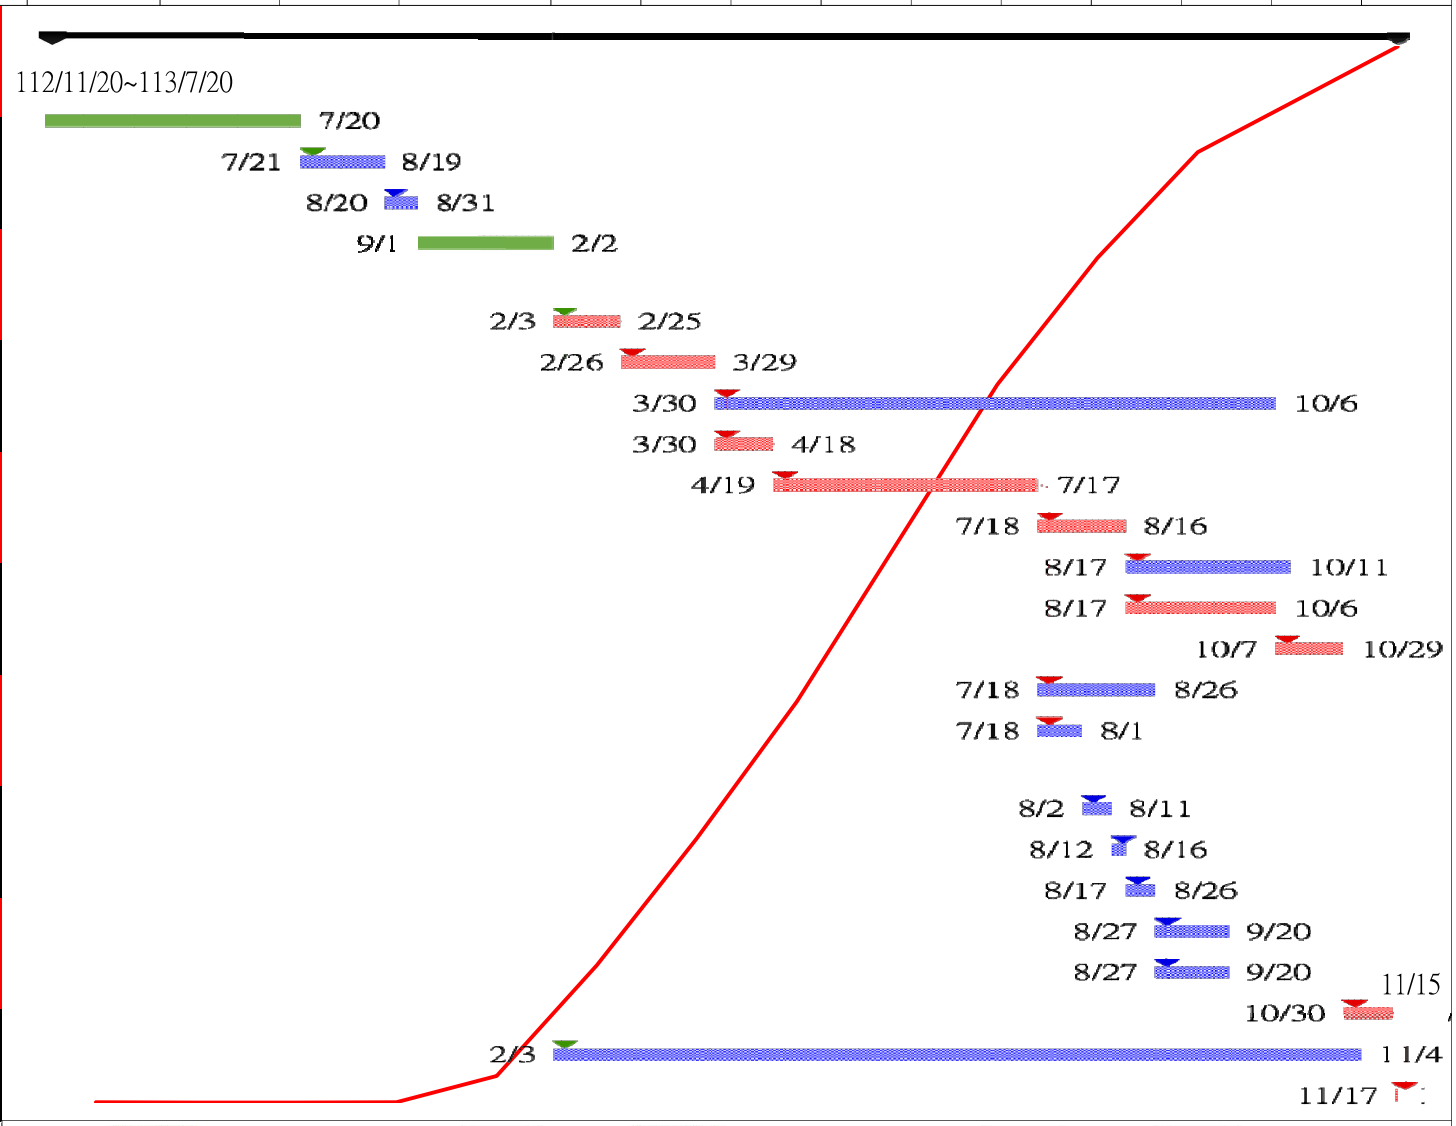

圖例: 任務 | 要徑任務 | 進度 | 里程碑 | 摘要 | 上顯型任務 | 上顯型要徑任務 | 上顯型里程碑 | 上顯型進度 | 分割 | 外部任務 | 專案摘要 | 摘要群組 | 期限 | 停工

		112年11月20日~113年7月20日	113年7月	113年8月	113年9月1日~114年2月2日	114年2月	114年3月	114年4月	114年5月	114年6月	114年7月	114年8月	114年9月	114年10月	114年11月
預定進度	預定進度	0.000%	0.001%	0.001%	0.001%	2.500%	10.500%	12.000%	13.000%	15.000%	15.000%	12.000%	10.000%	5.000%	4.997%
	累計預定進度	0.000%	0.001%	0.002%	0.003%	2.503%	13.003%	25.003%	38.003%	53.003%	68.003%	80.003%	90.003%	95.003%	100.000%
實際進度	實際進度														
	累計實際進度														

備註

承攬廠商:
